



**DREES &  
SOMMER**

# Schwierigkeiten und Herausforderungen von Fördermittelgewinnung rund um die Sportstättenmodernisierung

---

Bildungs- und Sportcampus Bürstadt

Barbara Schader, Bürgermeisterin,  
Stadt Bürstadt



# AGENDA

01 Wie alles begann...

02 Beteiligungsprozess

03 Unser Spirit – Das 5-Säulen-Konzept

04 Projekt und Förderkulisse

05 Aktueller Stand und Baufortschritt

06 Ausblick

# Wie alles begann...

---

## Projekthistorie

### Ist-Situation vor Beginn des Projektes:

- Mindergenutzte und stark überalterte Großsportanlage aus den 1970er Jahren
- Grundausrüstung und Sportinfrastruktur werden den zukünftigen Anforderungen nicht mehr gerecht
- Keine Synergieeffekte zwischen Sportarten oder Vereinen, keine gemeinsam genutzten Flächen
- Erhöhter Handlungsdruck aufgrund vielfältiger Erfolge der Vereine im sportlichen Bereich und einer erfolgreichen Kinder- und Jugendförderung
- Dringender Modernisierungsbedarf innerhalb der einzelnen Sportflächen



# Wie alles begann...

## Impuls durch die *alla hopp!*-Anlage

### Bewegung und Begegnung für alle Generationen:

- Eine von 19 Anlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar
- Finanzierung durch Dietmar Hopp Stiftung
- Bewegungs- und Begegnungsanlage mit einem sportwissenschaftlichen und sozialpädagogischem Konzept
- Bewegung fördern und ermöglichen, Gesundheit schützen
- Raum für Begegnung schaffen und Generationen durch die Freude an der Bewegung verbinden
- Aktiver Beitrag zum Erhalt der eigenen Gesundheit

## Initialzündung zur Entwicklung zu einer gesundheitsfördernden Kommune






# Wie alles begann...

## Mobilität neu gedacht: Bewegungsparcour durch die Stadt

- Verbindung der wichtigen kulturellen, sozialen und bewegenden Orte in der Stadt
- Ausbau eines öffentlichen Raums, der zum Benutzen und Bewegen animiert
- Ausbau des Fahrradnetzes als wesentliche Mobilitäts-Grundstruktur der Stadt

**Grundgedanke: Es geht nicht nur um Sport!**



# Wie alles begann...

## Der Sportpark wird zum Bildungs- und Bewegungscampus für alle Generationen

### Zusammenkunft von:

- Sport und Gesundheit
- Jugendförderung
- generationsübergreifender Bewegung und Begegnung
- schulischer Betreuung
- außerschulischen Bildungsangeboten



# Wie alles begann...

## Der Bildungs- und Sportcampus Bürstadt

- Neuinterpretation von Sport in der Stadt
- von der Vereinsanlage zum offenen Campus
- Verbindung von Bildungs- und Bewegungsangeboten
- Schaffung generationenübergreifender Angebote
- Ansiedelung des Jugendzentrums (Modernisierung eines Bestandsgebäudes)
- Pakt mit Schule für Betreuungsangebote (Bewegung und Bildung)
- Neue Räume für Integrationsarbeit


## Vom Zielplan zu einer ganzheitlichen Entwicklung



# Sport und Bewegung - Für Alle



# Gesundheit und Teilhabe - Für Alle



# AGENDA

01 Wie alles begann...

**02** Beteiligungsprozess

03 Unser Spirit – Das 5-Säulen-Konzept

04 Projekt und Förderkulisse


05 Aktueller Stand und Baufortschritt

06 Ausblick

# Beteiligungsprozess

## Der Erfolg des Projektes geht von den zentralen Akteuren aus:

- Kooperativer Beteiligungsprozess mit Vereinen und verantwortlichen Personen vor Ort
- Gemeinsames Identifizieren der Nutzerbedarfe unter fachlicher Leitung
- Konzeptentwicklung mit Berücksichtigung aller Anforderungen und Vorgaben
- Frühe Beteiligung von Fördergebern und Unterstützern
- Informationstermine für die Öffentlichkeit
- Gemeinsamer Dialog mit Vereinen und Nutzern z.B. Kunstrasenbesichtigung, Ausarbeitung von Nutzerverträgen
- Aktuelle Informationen via Projekthomepage mit Präsenz in Social Media und Tagespresse
- Regelmäßige Abstimmungen und Präsentationen in Stadtverwaltung und politischen Gremien

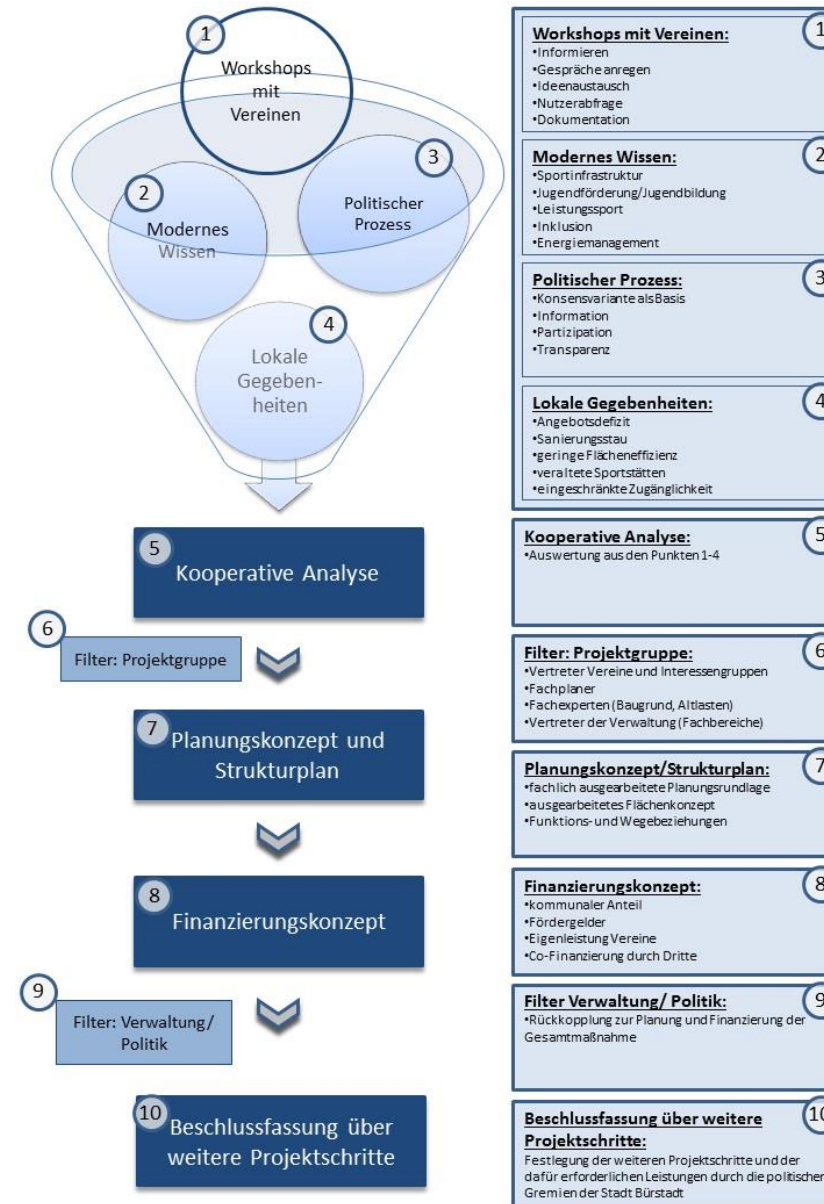

# AGENDA

01 Wie alles begann...

02 Beteiligungsprozess

**03 Unser Spirit – Das 5-Säulen-Konzept**

04 Projekt und Förderkulisse

05 Aktueller Stand und Baufortschritt


06 Ausblick

# Unser Spirit – Das 5-Säulen-Konzept

## Unsere Leitidee:

### Die Integration einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung in unsere Stadt

- Weiterentwicklung zu einem modernen und multifunktionalen Campusgelände, der ideale Möglichkeiten für Integration, Förderung, soziale Teilhabe und Entwicklung des Gemeinwesens schafft
- Auf der Tradition des alten Sportparks schaffen wir die Voraussetzungen für die Persönlichkeitsentwicklung im Zeichen von Toleranz, Respekt, Integration.
- Das Projekt bildet einen weiteren, elementaren Baustein eines Prozesses der Stadterneuerung und aktiven, nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung ab

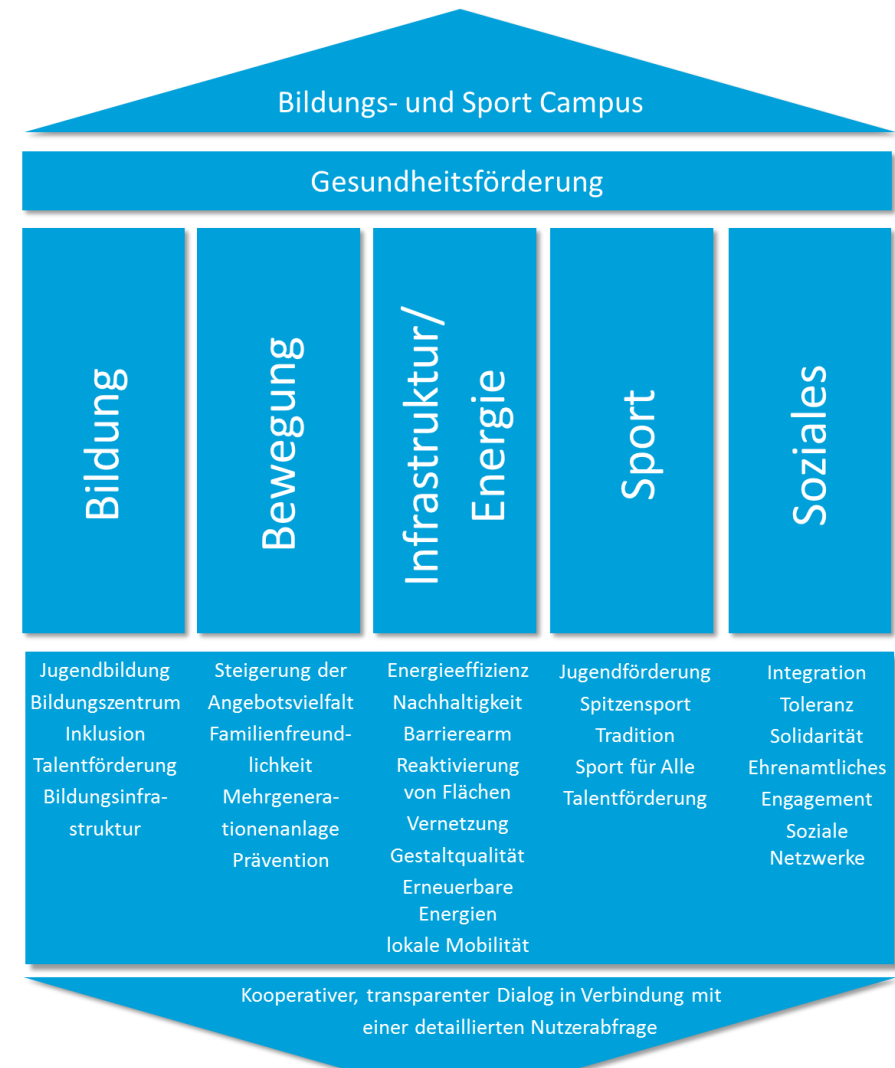

# Unser Spirit – Das 5-Säulen-Konzept

## BILDUNG

„Bildung ist neben Energie der Wachstumsmarkt der Zukunft“

Bea Beste, Deutsche Unternehmerin

## BEWEGUNG

„Bewegung steigert die Leistungsfähigkeit des Gehirns“

Stefan Schneider, Sportwissenschaftler Sporthochschule Köln

## INFRASTRUKTUR UND ENERGIE

„Die Bedeutung einer modernen Infrastruktur für den Sport erkennt man häufig erst dann, wenn sie fehlt“

Stefan Schneider, Sportwissenschaftler Sporthochschule Köln

## SPORT



„Wenn du mit deinem Team ein Schiff bauen willst, dann lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosem Meer“

Saint-Exupéry, franz. Schriftsteller

## SOZIALES

„Sportvereine sind in unserer Gesellschaft Integrationsfaktor Nummer eins. Sporttreiben in der Gemeinschaft und im Verein vermittelt Toleranz, Streitstand und Regelakzeptanz“

Prof. Dr. Gunter A. Pilz, Sportwissenschaftler Universität Hannover

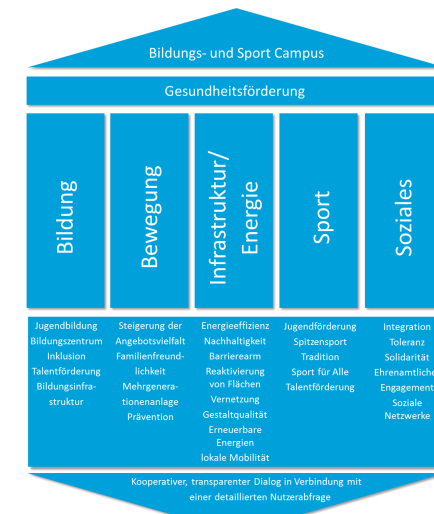

# AGENDA

01 Wie alles begann...

02 Beteiligungsprozess

03 Unser Spirit – Das 5-Säulen-Konzept

**04** Projekt und Förderkulisse

05 Aktueller Stand und Baufortschritt

06 Ausblick

# Projekt und Förderkulisse

---

Wir haben hohe sportliche Ziele und allen Ehrgeiz sie zu erreichen.

**Alleine können wir sie jedoch nicht erreichen.**

Es bedarf eines enormen Teamgeists, einer echten Gemeinschaft und einer guten Kondition, diese Herausforderung zu meistern und unsere Ziele zu erreichen.

**Das ist nur gemeinsam mit Partnerschaften, kooperativen Unterstützungen und Förderungen möglich.**



# Projekt und Förderkulisse

## Besondere Herausforderungen im Projekt:


- Bündelung unterschiedlicher Interessens- und Nutzergruppen
- Integration und Zusammenspiel verschiedener Themenbereiche und Förderschwerpunkten
- Vielschichtiger und umfangreicher Planungsaufwand
- Komplexe Baulegistik aufgrund parallel laufender Teilprojekte
- Interdisziplinäres Planer- und Gutachterteam
- Professionelle Gesamtsteuerung der Maßnahme
- Aktuelle Marktsituation und Preissteigerungen



# Projekt und Förderkulisse

## Übersicht von Förderprogrammen und Partnern:

- Dietmar Hopp Stiftung
- Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
- Land Hessen: Soziale Stadt
- Land Hessen: Soziale Integration im Quartier
- Bundesprogramm Sanierung Sport, Jugend und Kultureinrichtungen
- Bundesprogramm Wärmenetz 4.0
- Landessportbund Hessen
- Stiftungen, Sponsoren, weitere Dritte
- Klimakontingent Hessen

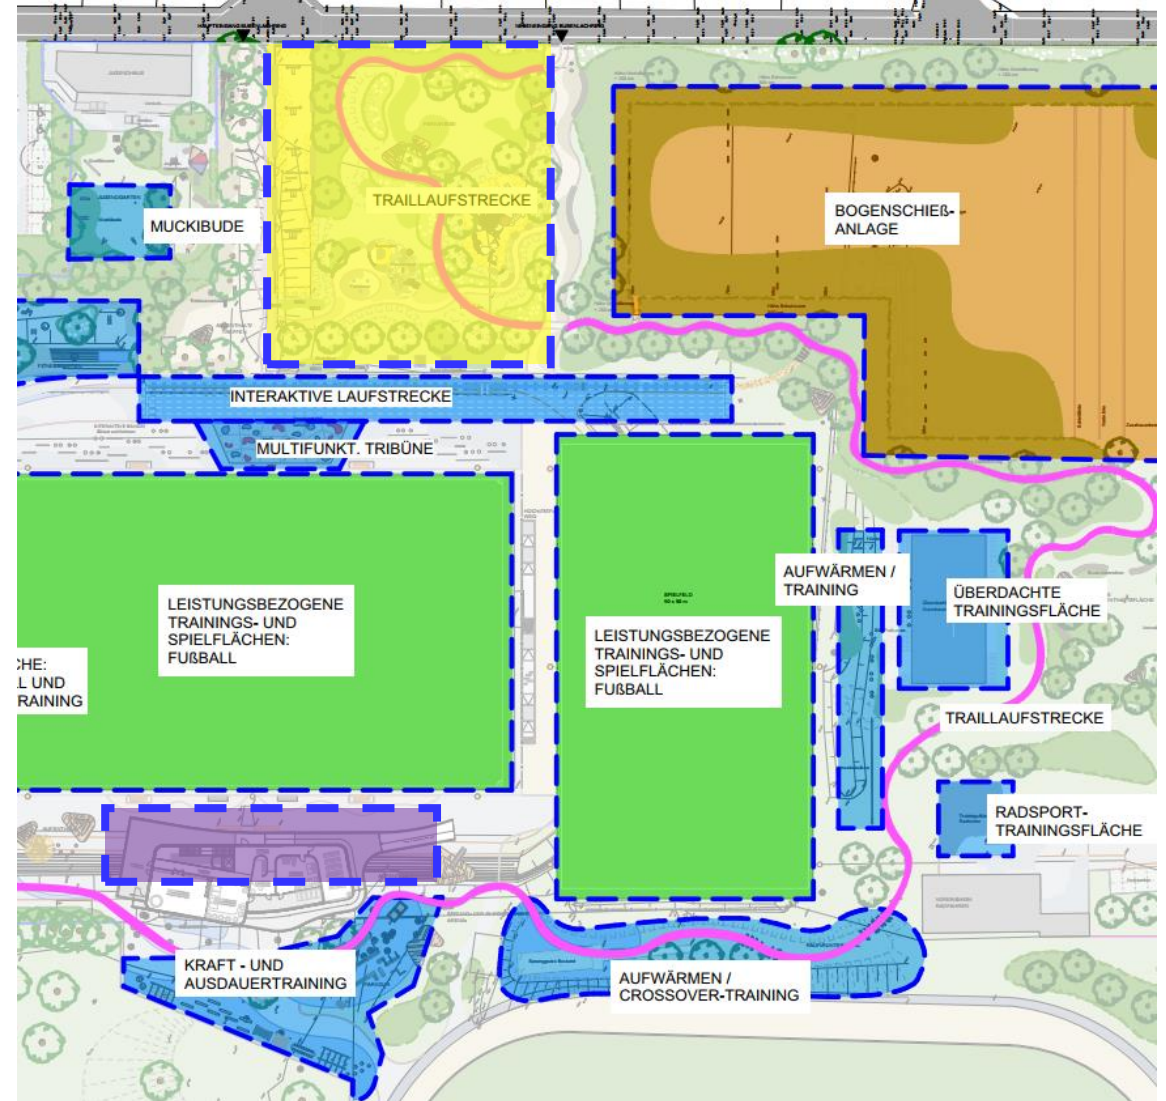


# Projekt und Förderkulisse

## Schwierigkeiten in der Fördermittelakquise:

- Sicherung von Fördermitteln aus allen Bereichen (Es geht nicht nur um Sport!)
- Berücksichtigung verschiedener förderrechtlicher Vorgaben in Beantragung, Abwicklung und Verwendung von Mitteln
- Klare und sinnvolle Abgrenzung der einzelnen Fördergegenstände
- Frühzeitiger Aufbau einer Vergabestruktur in Abstimmung mit Fördergebern
- Erarbeitung separater Leistungsverzeichnisse mit genauer Loszuordnung
- Detaillierte Dokumentation aller Entscheidungs- und Vergabeprozesse

Budget										Auftragswerte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Basisdaten										Auftragsstand	Abrechnungsstand	Auftragsprognose	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nr.	Gewerk	Auftragnehmer	Auftragsbeschreibung			Hauptauftrag	Zusatzaufträge	Auftragsstand		Abrechnungsstand	Auftragsprognose	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0039	4-700-28-01		Erdarbeiten Dachabriss			8.085,00	0,00	8.085,00	8.669,20	0,00		7.022,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0024	4-700-24-01	Tiede Ingenieurunternehmung GmbH	Bildungszentrum: TGA Planung (1,2,3)			90.714,63	0,00	90.714,63	10.367,28	0,00		10.367,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Rechnung</th> <th>RNR</th> <th>Status</th> <th>Re.Eingang</th> <th>Re.Datum</th> <th>Leistungszuw.</th> <th>Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.</th> <th>Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.</th> <th colspan="3">interne Notiz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1303-19303</td> <td>Abschlagsrechnung</td> <td>1</td> <td>geprüft/teilgeige</td> <td>16.12.2019</td> <td>16.12.2019</td> <td>9.978,61</td> <td>11.874,55</td> <td>9.978,61</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1315-19303</td> <td>Abschlagsrechnung</td> <td>2</td> <td>geprüft/teilgeige</td> <td>19.12.2019</td> <td>04.12.2019</td> <td>388,67</td> <td>462,51</td> <td>388,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>												Nr.	Rechnung	RNR	Status	Re.Eingang	Re.Datum	Leistungszuw.	Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.	interne Notiz			1303-19303	Abschlagsrechnung	1	geprüft/teilgeige	16.12.2019	16.12.2019	9.978,61	11.874,55	9.978,61				1315-19303	Abschlagsrechnung	2	geprüft/teilgeige	19.12.2019	04.12.2019	388,67	462,51	388,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nr.	Rechnung	RNR	Status	Re.Eingang	Re.Datum	Leistungszuw.	Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.	interne Notiz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1303-19303	Abschlagsrechnung	1	geprüft/teilgeige	16.12.2019	16.12.2019	9.978,61	11.874,55	9.978,61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1315-19303	Abschlagsrechnung	2	geprüft/teilgeige	19.12.2019	04.12.2019	388,67	462,51	388,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0035	4-700-34-01	Tiede Ingenieurunternehmung GmbH	TA Außenanlagen			3.031,30	0,00	3.031,30	10.367,28	0,00		10.367,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Rechnung</th> <th>RNR</th> <th>Status</th> <th>Re.Eingang</th> <th>Re.Datum</th> <th>Leistungszuw.</th> <th>Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.</th> <th>Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.</th> <th colspan="3">interne Notiz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1304-19303</td> <td>Abschlagsrechnung</td> <td>1</td> <td>geprüft/teilgeige</td> <td>20.10.2019</td> <td>18.10.2019</td> <td>3.031,30</td> <td>3.607,25</td> <td>3.031,30</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1315-19303</td> <td>Abschlagsrechnung</td> <td>2</td> <td>geprüft/teilgeige</td> <td>06.12.2019</td> <td>04.12.2019</td> <td>7.335,98</td> <td>8.729,81</td> <td>7.335,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>												Nr.	Rechnung	RNR	Status	Re.Eingang	Re.Datum	Leistungszuw.	Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.	interne Notiz			1304-19303	Abschlagsrechnung	1	geprüft/teilgeige	20.10.2019	18.10.2019	3.031,30	3.607,25	3.031,30				1315-19303	Abschlagsrechnung	2	geprüft/teilgeige	06.12.2019	04.12.2019	7.335,98	8.729,81	7.335,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nr.	Rechnung	RNR	Status	Re.Eingang	Re.Datum	Leistungszuw.	Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.	interne Notiz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1304-19303	Abschlagsrechnung	1	geprüft/teilgeige	20.10.2019	18.10.2019	3.031,30	3.607,25	3.031,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1315-19303	Abschlagsrechnung	2	geprüft/teilgeige	06.12.2019	04.12.2019	7.335,98	8.729,81	7.335,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0005	4-700-04-01	Tauber	Kampfmittelsondierung			15.120,00	0,00	15.120,00	10.771,96	0,00		10.771,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0007	4-700-06-01	CDM Smith Consult	Schadstoffgutachten			8.987,60	0,00	9.987,60	10.959,90	0,00		10.959,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Rechnung</th> <th>RNR</th> <th>Status</th> <th>Re.Eingang</th> <th>Re.Datum</th> <th>Leistungszuw.</th> <th>Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.</th> <th>Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.</th> <th colspan="3">interne Notiz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18020654</td> <td>Abschlagsrechnung</td> <td>1</td> <td>geprüft/teilgeige</td> <td>05.04.2018</td> <td>28.02.2018</td> <td>3.892,25</td> <td>4.629,16</td> <td>3.892,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>18021107</td> <td>Schlussrechnung</td> <td>1</td> <td>geprüft/teilgeige</td> <td>01.04.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.600.000</td> <td>2.561.889</td> <td>2.856.889</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nr.	Rechnung	RNR	Status	Re.Eingang	Re.Datum	Leistungszuw.	Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.	interne Notiz			18020654	Abschlagsrechnung	1	geprüft/teilgeige	05.04.2018	28.02.2018	3.892,25	4.629,16	3.892,25				18021107	Schlussrechnung	1	geprüft/teilgeige	01.04.2018					2.600.000	2.561.889	2.856.889																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nr.	Rechnung	RNR	Status	Re.Eingang	Re.Datum	Leistungszuw.	Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.	interne Notiz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18020654	Abschlagsrechnung	1	geprüft/teilgeige	05.04.2018	28.02.2018	3.892,25	4.629,16	3.892,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18021107	Schlussrechnung	1	geprüft/teilgeige	01.04.2018					2.600.000	2.561.889	2.856.889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Rechnung</th> <th>RNR</th> <th>Status</th> <th>Re.Eingang</th> <th>Re.Datum</th> <th>Leistungszuw.</th> <th>Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.</th> <th>Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.</th> <th colspan="3">interne Notiz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0023</td> <td>4-700-23-01</td> <td>Werner Sobek Frankfurt GmbH &amp; Co. KG</td> <td colspan="3">Bildungszentrum: Bauphysik</td> <td>2.600.000</td> <td>2.561.889</td> <td>2.856.889</td> <td>11.896,89</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>0004</td> <td>4-700-03-01</td> <td>AVS</td> <td colspan="3">Vermessung AVS</td> <td>4-700-86-01</td> <td>Abbruchgenehmigung</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>301</td> <td>301</td> <td>14.194,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0021</td> <td>4-700-22-01</td> <td>Bodenmechanisches Labor Gumm - Büro</td> <td colspan="3">Bodengutachten - Zusätzliche</td> <td>4-700-100-01</td> <td>Abklebmen der Flutlichtstrahler</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>182</td> <td>182</td> <td>232.100,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0020</td> <td>4-700-21-01</td> <td>tt</td> <td colspan="3">Erstellung Energiekonzept</td> <td>4-700-52-01</td> <td>Analyse Materialprobe Bandenzaun</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>564</td> <td>564</td> <td>46.625,63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0019</td> <td>4-700-20-01</td> <td>prosa Architektur - Stadtplanung BDA Qu</td> <td colspan="3">Bildungszentrum Objektplanu</td> <td>4-700-119-01</td> <td>Annahme Fördermittelmanagement</td> <td>nicht erfasst</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>4-700-01-01</td> <td>Drees &amp; Sommer infra Consult und Entwic</td> <td colspan="3">Projektsteuerung Grundlieu</td> <td>4-700-98-01</td> <td>Annahme Planung und Umsetzung Beschilderungskonzept</td> <td>nicht erfasst</td> <td>0</td> <td>25.000</td> <td>51.107,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0032</td> <td>4-700-31-01</td> <td>Drees &amp; Sommer infra Consult und Entwic</td> <td colspan="3">Frei- und Sportanlagenplanu</td> <td>4-700-99-01</td> <td>Annahme zusätzliche Gutachterleistungen</td> <td>nicht erfasst</td> <td>0</td> <td>20.000</td> <td>67.900,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0029</td> <td>4-700-28-01</td> <td>Drees &amp; Sommer infra Consult und Entwic</td> <td colspan="3">Zusätzliche Leistungen der Pr</td> <td>4-700-96-01</td> <td>Annahme zusätzliche und besondere Leistungen Planung und Steuerung</td> <td>nicht erfasst</td> <td>0</td> <td>200.000</td> <td>105.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-114-01</td> <td>Ausrüstung Richtigfest (Festplatzgarnituren, etc.)</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>105.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-63-01</td> <td>Bauantrag Freiluft Halle</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>1.255</td> <td>1.255</td> <td>181.772,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-63-01</td> <td>Baubegleitung</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>9.705</td> <td>9.705</td> <td>9.705</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-82-01</td> <td>Baugenehmigung - Neubau Bildungszentrum</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>5.701</td> <td>5.701</td> <td>5.701</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-87-01</td> <td>Baugenehmigung Freiluft Halle</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>1.791</td> <td>1.791</td> <td>1.791</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-89-01</td> <td>Baugenehmigung Neubau Freianlagen</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>5.724</td> <td>5.724</td> <td>5.724</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-102-01</td> <td>Baugrunduntersuchungen</td> <td>nicht erfasst</td> <td>15.520</td> <td>15.520</td> <td>15.520</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-65-01</td> <td>Bauschild Sportcampus umsetzen</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>1.426</td> <td>1.426</td> <td>1.426</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-09-01</td> <td>Bauschilder</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>7.590</td> <td>7.590</td> <td>7.590</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-56-01</td> <td>Baustatische Prüfung</td> <td>nicht erfasst</td> <td>11.837</td> <td>11.837</td> <td>11.837</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-115-01</td> <td>Baustromversorgung/Baustromverteiler</td> <td>nicht erfasst</td> <td>35.303</td> <td>35.303</td> <td>35.303</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-118-01</td> <td>Baustromverbrauch</td> <td>nicht erfasst</td> <td>1.094</td> <td>1.094</td> <td>1.094</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-117-01</td> <td>Bauwasser</td> <td>nicht erfasst</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-110-01</td> <td>Berechnung gebäudebezogene Lebenszykluskosten Neubau</td> <td>nicht erfasst</td> <td>3.750</td> <td>3.750</td> <td>3.750</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-93-01</td> <td>Besprechungscontainer Hochbau</td> <td>in 2,6 Mio. erfasst</td> <td>8.817</td> <td>8.817</td> <td>8.817</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>4-700-112-01</td> <td>Bestandsaufnahme/Vermessung Gelände</td> <td>nicht erfasst</td> <td>4.600</td> <td>4.600</td> <td>4.600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nr.	Rechnung	RNR	Status	Re.Eingang	Re.Datum	Leistungszuw.	Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.	interne Notiz			0023	4-700-23-01	Werner Sobek Frankfurt GmbH & Co. KG	Bildungszentrum: Bauphysik			2.600.000	2.561.889	2.856.889	11.896,89				0004	4-700-03-01	AVS	Vermessung AVS			4-700-86-01	Abbruchgenehmigung	in 2,6 Mio. erfasst	301	301	14.194,50		0021	4-700-22-01	Bodenmechanisches Labor Gumm - Büro	Bodengutachten - Zusätzliche			4-700-100-01	Abklebmen der Flutlichtstrahler	in 2,6 Mio. erfasst	182	182	232.100,00		0020	4-700-21-01	tt	Erstellung Energiekonzept			4-700-52-01	Analyse Materialprobe Bandenzaun	in 2,6 Mio. erfasst	564	564	46.625,63		0019	4-700-20-01	prosa Architektur - Stadtplanung BDA Qu	Bildungszentrum Objektplanu			4-700-119-01	Annahme Fördermittelmanagement	nicht erfasst	0	0	50.000		0002	4-700-01-01	Drees & Sommer infra Consult und Entwic	Projektsteuerung Grundlieu			4-700-98-01	Annahme Planung und Umsetzung Beschilderungskonzept	nicht erfasst	0	25.000	51.107,83		0032	4-700-31-01	Drees & Sommer infra Consult und Entwic	Frei- und Sportanlagenplanu			4-700-99-01	Annahme zusätzliche Gutachterleistungen	nicht erfasst	0	20.000	67.900,00		0029	4-700-28-01	Drees & Sommer infra Consult und Entwic	Zusätzliche Leistungen der Pr			4-700-96-01	Annahme zusätzliche und besondere Leistungen Planung und Steuerung	nicht erfasst	0	200.000	105.000,00								4-700-114-01	Ausrüstung Richtigfest (Festplatzgarnituren, etc.)	in 2,6 Mio. erfasst	130	130	105.000,00								4-700-63-01	Bauantrag Freiluft Halle	in 2,6 Mio. erfasst	1.255	1.255	181.772,44								4-700-63-01	Baubegleitung	in 2,6 Mio. erfasst	9.705	9.705	9.705								4-700-82-01	Baugenehmigung - Neubau Bildungszentrum	in 2,6 Mio. erfasst	5.701	5.701	5.701								4-700-87-01	Baugenehmigung Freiluft Halle	in 2,6 Mio. erfasst	1.791	1.791	1.791								4-700-89-01	Baugenehmigung Neubau Freianlagen	in 2,6 Mio. erfasst	5.724	5.724	5.724								4-700-102-01	Baugrunduntersuchungen	nicht erfasst	15.520	15.520	15.520								4-700-65-01	Bauschild Sportcampus umsetzen	in 2,6 Mio. erfasst	1.426	1.426	1.426								4-700-09-01	Bauschilder	in 2,6 Mio. erfasst	7.590	7.590	7.590								4-700-56-01	Baustatische Prüfung	nicht erfasst	11.837	11.837	11.837								4-700-115-01	Baustromversorgung/Baustromverteiler	nicht erfasst	35.303	35.303	35.303								4-700-118-01	Baustromverbrauch	nicht erfasst	1.094	1.094	1.094								4-700-117-01	Bauwasser	nicht erfasst	60	60	60								4-700-110-01	Berechnung gebäudebezogene Lebenszykluskosten Neubau	nicht erfasst	3.750	3.750	3.750								4-700-93-01	Besprechungscontainer Hochbau	in 2,6 Mio. erfasst	8.817	8.817	8.817								4-700-112-01	Bestandsaufnahme/Vermessung Gelände	nicht erfasst	4.600	4.600	4.600	
Nr.	Rechnung	RNR	Status	Re.Eingang	Re.Datum	Leistungszuw.	Anweisbetrag nach Skonto inkl. USt.	Anweisbetrag vor Skonto exkl. USt.	interne Notiz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0023	4-700-23-01	Werner Sobek Frankfurt GmbH & Co. KG	Bildungszentrum: Bauphysik			2.600.000	2.561.889	2.856.889	11.896,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0004	4-700-03-01	AVS	Vermessung AVS			4-700-86-01	Abbruchgenehmigung	in 2,6 Mio. erfasst	301	301	14.194,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0021	4-700-22-01	Bodenmechanisches Labor Gumm - Büro	Bodengutachten - Zusätzliche			4-700-100-01	Abklebmen der Flutlichtstrahler	in 2,6 Mio. erfasst	182	182	232.100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0020	4-700-21-01	tt	Erstellung Energiekonzept			4-700-52-01	Analyse Materialprobe Bandenzaun	in 2,6 Mio. erfasst	564	564	46.625,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0019	4-700-20-01	prosa Architektur - Stadtplanung BDA Qu	Bildungszentrum Objektplanu			4-700-119-01	Annahme Fördermittelmanagement	nicht erfasst	0	0	50.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0002	4-700-01-01	Drees & Sommer infra Consult und Entwic	Projektsteuerung Grundlieu			4-700-98-01	Annahme Planung und Umsetzung Beschilderungskonzept	nicht erfasst	0	25.000	51.107,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0032	4-700-31-01	Drees & Sommer infra Consult und Entwic	Frei- und Sportanlagenplanu			4-700-99-01	Annahme zusätzliche Gutachterleistungen	nicht erfasst	0	20.000	67.900,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0029	4-700-28-01	Drees & Sommer infra Consult und Entwic	Zusätzliche Leistungen der Pr			4-700-96-01	Annahme zusätzliche und besondere Leistungen Planung und Steuerung	nicht erfasst	0	200.000	105.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-114-01	Ausrüstung Richtigfest (Festplatzgarnituren, etc.)	in 2,6 Mio. erfasst	130	130	105.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-63-01	Bauantrag Freiluft Halle	in 2,6 Mio. erfasst	1.255	1.255	181.772,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-63-01	Baubegleitung	in 2,6 Mio. erfasst	9.705	9.705	9.705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-82-01	Baugenehmigung - Neubau Bildungszentrum	in 2,6 Mio. erfasst	5.701	5.701	5.701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-87-01	Baugenehmigung Freiluft Halle	in 2,6 Mio. erfasst	1.791	1.791	1.791																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-89-01	Baugenehmigung Neubau Freianlagen	in 2,6 Mio. erfasst	5.724	5.724	5.724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-102-01	Baugrunduntersuchungen	nicht erfasst	15.520	15.520	15.520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-65-01	Bauschild Sportcampus umsetzen	in 2,6 Mio. erfasst	1.426	1.426	1.426																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-09-01	Bauschilder	in 2,6 Mio. erfasst	7.590	7.590	7.590																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-56-01	Baustatische Prüfung	nicht erfasst	11.837	11.837	11.837																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-115-01	Baustromversorgung/Baustromverteiler	nicht erfasst	35.303	35.303	35.303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-118-01	Baustromverbrauch	nicht erfasst	1.094	1.094	1.094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-117-01	Bauwasser	nicht erfasst	60	60	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-110-01	Berechnung gebäudebezogene Lebenszykluskosten Neubau	nicht erfasst	3.750	3.750	3.750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-93-01	Besprechungscontainer Hochbau	in 2,6 Mio. erfasst	8.817	8.817	8.817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						4-700-112-01	Bestandsaufnahme/Vermessung Gelände	nicht erfasst	4.600	4.600	4.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

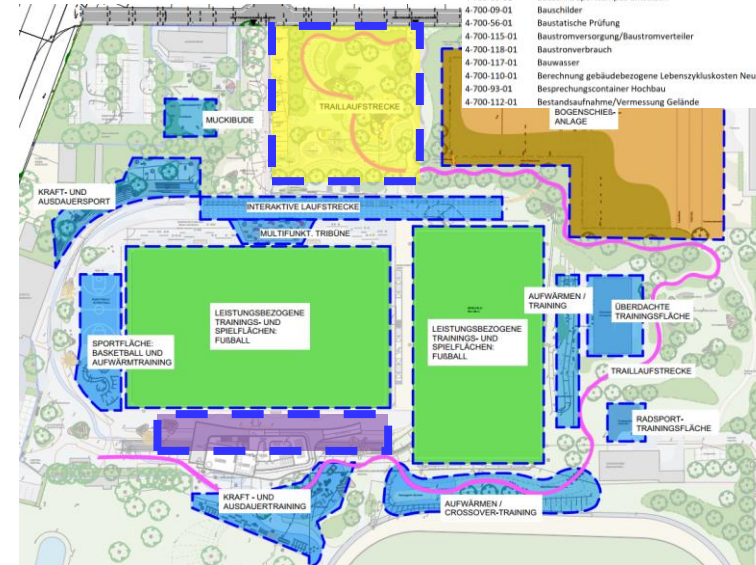

# AGENDA

01 Wie alles begann...

02 Beteiligungsprozess

03 Unser Spirit – Das 5-Säulen-Konzept

04 Projekt und Förderkulisse

**05 Aktueller Stand und Baufortschritt**

06 Ausblick

# Aktueller Stand und Baufortschritt

---

- Feierlicher Spatenstich und Richtfest
- Tag der Städtebauförderung
- Abschluss der Tiefbauarbeiten Campus
- Verlegung des Wärmenetzes und Arealstromnetzes
- Innenausbau des Bildungszentrums
- Herstellung der Sport- und Außenflächen



# AGENDA

01 Wie alles begann...

02 Beteiligungsprozess

03 Unser Spirit – Das 5-Säulen-Konzept

04 Projekt und Förderkulisse

05 Aktueller Stand und Baufortschritt

**06 Ausblick**

# Ausblick

---

- Abschluss der wesentlichen Bauleistungen in 2023
- Baubeginn des Bewegungskindergarten in 2023
- Regelmäßiger Austausch mit Fördergebern, Presse und Beteiligten
- **Geplante Einweihung im September 2023**
- Abschluss der Gesamtmaßnahme in 2024



Einweihung  
im  
September  
2023

Wir sind auf dem Weg.

**Vielen Dank!**

